


<b>CONT/CONV:</b>	CT - 189/2022	<b>BAIRRO:</b>	Plano Piloto (RA I)
<b>OBJETO:</b>	<b>Implantação de infraestrutura de drenagem pluvial referente ao Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 - Lote 3</b>		
<b>CONTRATADA:</b>	HL TERRAPLENAGEM LTDA	<b>TOTAL PAGO:</b>	R\$ 27.585.565,34
<b>TIPO DE SERVIÇO:</b>	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	<b>SALDO:</b>	R\$ 6.914.434,66
<b>ASSINATURA DO CONTRATO:</b>	08/12/2022	<b>DATA DA ATUALIZAÇÃO:</b>	25/03/2024
<b>PREVISÃO DE CONCLUSÃO</b>	abril-24	<b>PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:</b>	04/05/2024
		<b>VALOR DO CONTRATO:</b>	R\$ 34.500.000,00
		<b>PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:</b>	82%



**Terracap**


Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

**Implantação de infraestrutura de drenagem pluvial referente ao Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 - Lote 3**



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

**PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:**

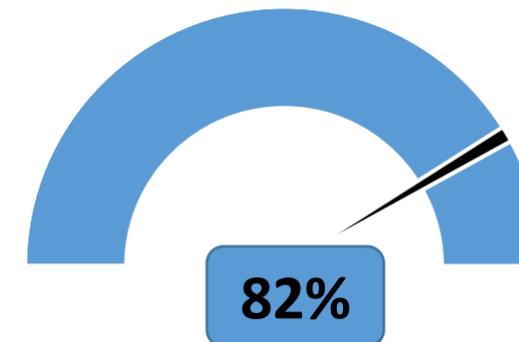

**CLIQUE AQUI PARA FOLDER E PROJETOS**  
**GALERIA DE FOTOS**
