


CONT/CONV:	CT - 1/2023	BAIRRO:	Plano Piloto (RA I)
OBJETO:	Implantação de infraestrutura de drenagem pluvial referente ao Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 - Lote 2		
CONTRATADA:	TVA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	TOTAL PAGO:	R\$ 10.260.613,71
TIPO DE SERVIÇO:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	SALDO:	R\$ 21.317.734,64
ASSINATURA DO CONTRATO:	03/01/2023	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	12/03/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	junho-24	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	21/04/2024
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 31.578.348,35
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	36%



Terracap


Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Implantação de infraestrutura de drenagem pluvial referente ao Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 - Lote 2



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

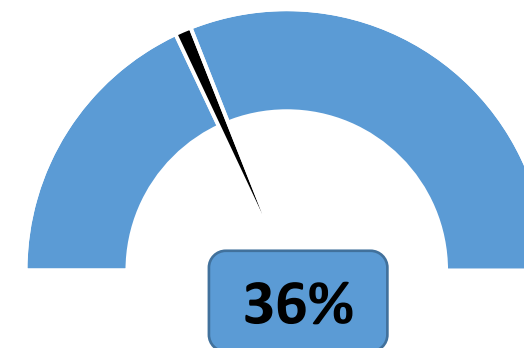

CLIQUE AQUI PARA FOLDER E PROJETOS
GALERIA DE FOTOS
