


CONT/CONV:	CT - 4/2023	BAIRRO:	Plano Piloto (RA I)
OBJETO:	Implantação de infraestrutura de drenagem pluvial referente ao Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 - Lote 5		
CONTRATADA:	TELAR ENGENHARIA E COMERCIO SA	TOTAL PAGO:	R\$ 9.627.555,89
TIPO DE SERVIÇO:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	SALDO:	R\$ 23.382.444,11
ASSINATURA DO CONTRATO:	16/01/2023	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	20/03/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	junho-24	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	29/04/2024
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 33.010.000,00
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	24%



Terracap


Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Implantação de infraestrutura de drenagem pluvial referente ao Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 - Lote 5



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

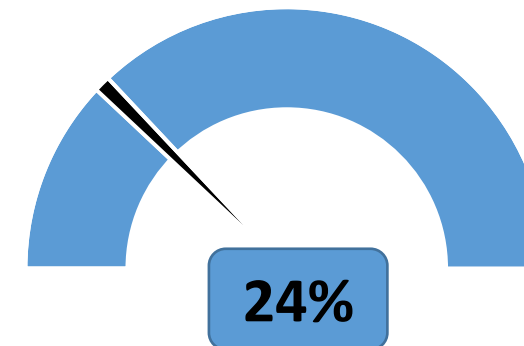

CLIQUE AQUI PARA FOLDER E PROJETOS
GALERIA DE FOTOS
