


CONT/CONV:	CT - 6/2023	BAIRRO:	Plano Piloto (RA I)
OBJETO:	Implantação de infraestrutura de drenagem pluvial referente ao Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 - Lote 4		
CONTRATADA:	TRIER ENGENHARIA SA	TOTAL PAGO:	R\$ 23.762.894,83
TIPO DE SERVIÇO:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	SALDO:	R\$ 10.349.991,56
ASSINATURA DO CONTRATO:	10/01/2023	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	13/03/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	maio-24	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	22/04/2024
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 34.112.886,39
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	66%



Terracap


Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Implantação de infraestrutura de drenagem pluvial referente ao Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 - Lote 4



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

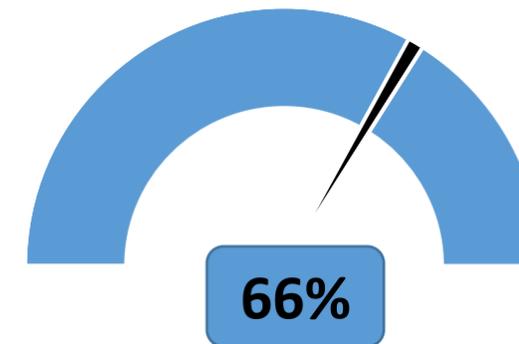

CLIQUE AQUI PARA FOLDER E PROJETOS
GALERIA DE FOTOS
